

24.10.2020 Sportanlage – Trinkwasserprojekt – Bericht Nr. 4


Heute starteten wir bereits um 7.00 Uhr mit dem Imprägnieren der am Vortag eingekauften Nut- und Federbretter für den Außenbereich der Trinkwasseranlage. Beim Erstanstrich war es noch dunkel und beim Zweitanstrich dann schon hell.




Die ersten Bretter waren zügig zurechtgeschnitten und montiert. Da wir nicht wussten, ob es noch regnet, haben wir gleich die ersten Bleche angepasst und angeschraubt.



Das Ausschneiden der Löcher für die Rohre war etwas aufwendiger, aber für Danilo natürlich kein Problem. So ging es Brett für Brett weiter voran.

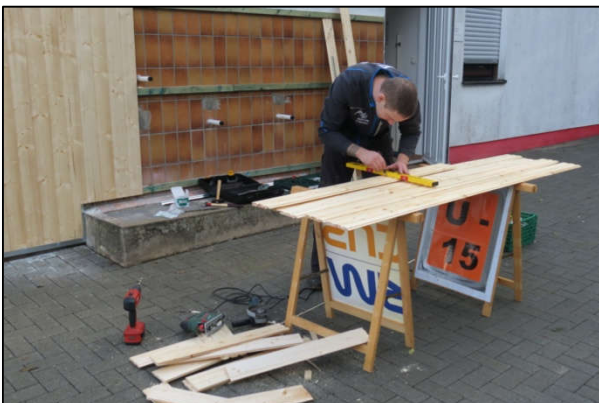

Zum Schluss noch die restlichen Bleche und dann die Vorderseite ein 3. Mal mit Imprägnierung gestrichen, damit das Holz möglichst lange hält und gut aussieht.

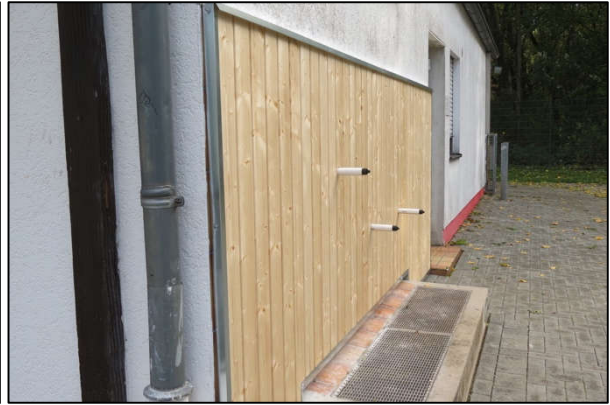

Da wir fertig werden und die Firma Reichel & Steinmetz mit der Montage der Wasserhähne beauftragen wollten, haben Danilo und ich uns sonntagsmorgens getroffen und die Wand mit der guten Bondex-Holzlasur 2x gestrichen.



Zum Schluss haben wir noch das Sponsorenschild der Mainova angebracht, die das Projekt mit EUR 800,- unterstützt haben.



Jetzt muss nur noch der Sockel des Schuhputzbeckens gesäubert, grundiert und gestrichen werden. Wenn die Wasserhähne montiert sind, ist auch dieses Projekt abgeschlossen. Der letzte Bericht dazu folgt 😊

Bis dann & viele Grüße
Christoph
