


Bericht Nr. 7 – Fast geschafft – 15.06.2019


Für diesen Samstag habe ich beim Maeusel weitere 4,5cbm Schotter und bei Kinzer erneut einen Rüttler bestellt. Zu viert ging es am frühen Morgen an die Arbeit, die in erster Linie wieder aus schippen & rütteln bestand.



Danach haben wir die Betonplatten verlegt, auf die später der Container gestellt wird. Jetzt hieß es messen, ausrichten nachmessen und wieder die Wasserwaage auflegen, bis alle Platten perfekt gelegen haben....wie gut das wir unseren Danilo haben ☺

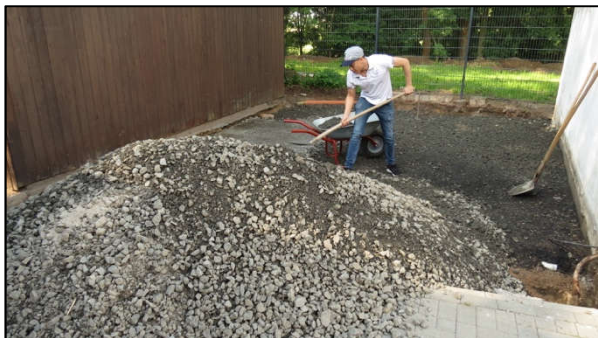


Danach haben wir den Bereich hinter der Leichtathletikhütte mit Schotter aufgefüllt, mit dem Rüttler verdichtet und 2 Rasenbordsteine gesetzt, die später als Stufe dienen.

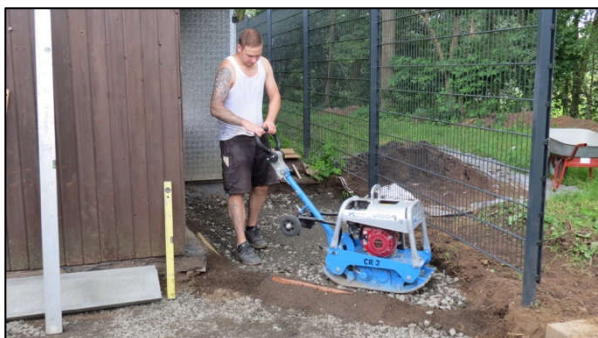

Gleichzeitig kümmerte sich Olaf Becker um die Elektrik. Nachdem er letzten Samstag bereits alle Arbeiten geplant hatte sowie die Materialliste und das notwendige Werkzeug zusammenstellte, hat er heute den Sicherungskasten und das Schloss abgeklemmt, abmontiert und vorne wieder anmontiert. Dazu mussten Kabel verlegt,

neu eingezogen und angeschlossen werden. Im Ergebnis sieht man wie so oft nicht viel, aber eine Menge Arbeit war es trotzdem. Dafür vielen herzlichen Dank, lieber Olaf.

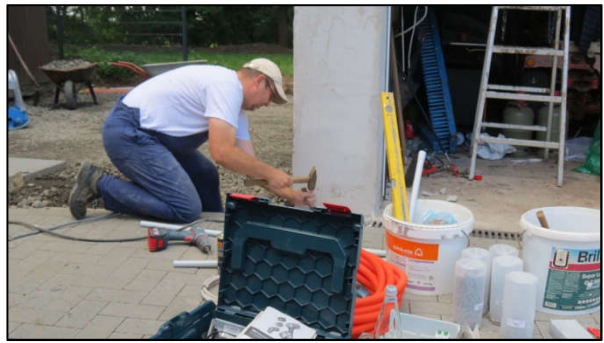

Die Fläche ist nun gut verdichtet und wird auf der rechten Hälfte nur noch etwas mit Kies aufgefüllt, bevor der Container wieder umgestellt wird. Den Kies holen wir uns am Kletterturm, wo ohnehin einige Kubikmeter entnommen werden müssen, bevor die Outdoor-Matten verlegt werden.



Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer Christoph
