


## Bericht Nr. 2 – Die Bewehrungseisen für unseren Boulderblock

Heute wurden die Bewehrungseisen für unseren Boulderblock von der Firma RSB Stahl-Biegerei GmbH in Darmstadt auf den Parkplatz unserer Sportanlage geliefert.



Sogleich macht sich unser Projekt- und Abteilungsleiter Peter an die Arbeit und hat die Eisenmatten entsprechend dem Bewehrungsplan des Statikers zugeschnitten.

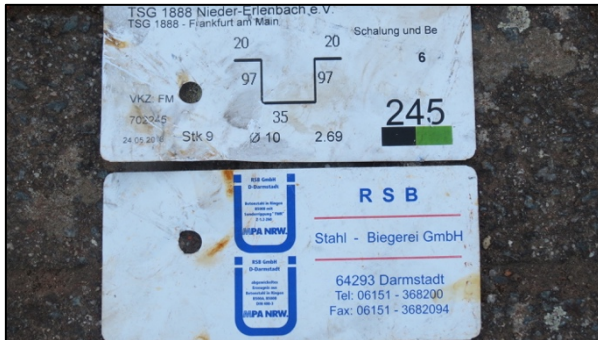

Danach haben wir alle Eisen zum Turm gebracht und kontrolliert, ob alle Bewehrungseisen vollständig sind.



Spätesten jetzt wurde klar, dass das Bewehrungsgerüst doch nicht so einfach zusammengebaut werden kann. Es folgten längere Überlegungen und Diskussionen bis in die Abendstunden hinein.



Morgen wird die Sauberkeitsschicht (5cm Magerbeton => 0,25 Kubikmeter) in das Fundament gegossen. Am Samstag geht es dann weiter mit der Einschalung des ersten von zwei Fundamenten sowie den Aufbau des Bewehrungsgerüsts. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das mit professioneller Unterstützung unserer Bauingenieurin Gabi hinbekommen.

Bis zum nächsten Bericht,  
Euer Christoph
